SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	FICHE ACTION REGARD DE VISITE	14
	PRIORITE	P1

Commune	**CORNEILLA-LA-RIVIERE**	Maître d'ouvrage	CORNEILLA-LA-RIVIERE
Opération	**Réhabilitation du regard de visite**	Cause de l'opération	**Elimination d'eaux claires parasites**

1. LOCALISATION DU PROJET

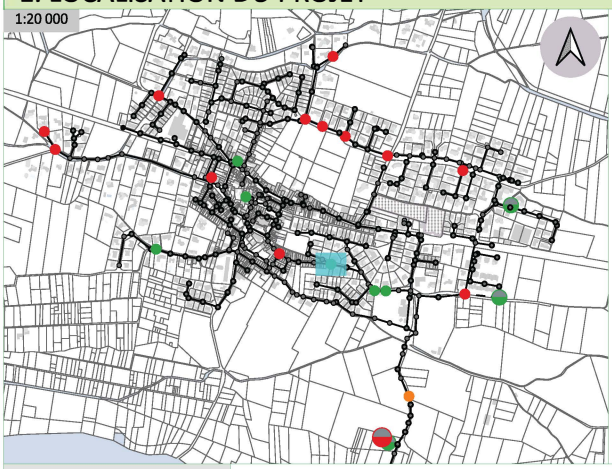

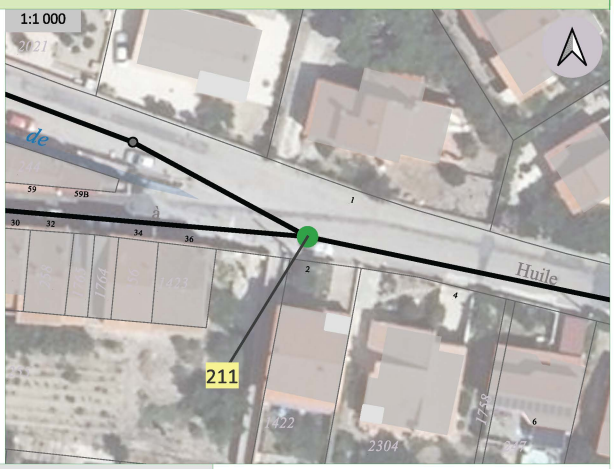

Adresse	Rue du Stade 2	Coord. X (L93)	6177434.817 m
Numéro	Regard de visite N°211	Coord. Y (L93)	677997.96 m

2. IDENTIFICATION DU REGARD DE VISITE

Photographie extérieure

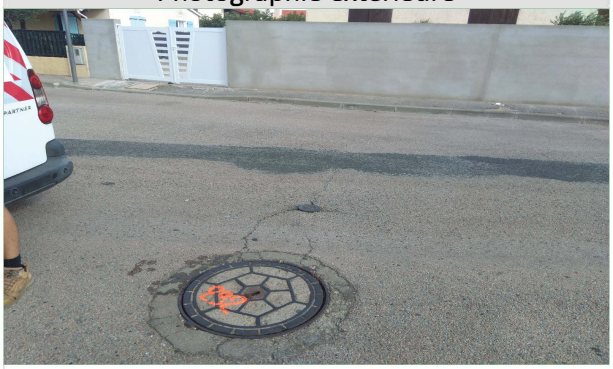

Photographie intérieure

3. CARACTERISTIQUES DU REGARD DE VISITE

Forme tampon	Circulaire
Forme cheminée	Circulaire
Dimension cheminée	Ø800
Matériau cheminée	Matériau à base de béton
Profondeur	217

4. ANOMALIES CONSTATEES

Structure	Fissures / Défaut d'étanchéité / Abrasion
Ecoulement	
Volume	Apport d'ECPP
Etat général	Mauvais
Cause non conforme	ECP

5. PROPOSITION DE TRAVAUX

Nature des travaux	**Réfection du branchement particulier**	Estimation du coût
Gains attendus	Elimination de 4.32 m³/j	347.2 €HT/m³/j
Inconvénients	Surprofondeur (>1,5 m)	
Remarque		1500 €HT/u
